Bantu e.V.

PROJEKTBERICHT
MBARARA CITY, SÜDWEST-UGANDA

BANTU E.V. · UGANDA · P 24/200

Berufsbildung an der Msingi School

Friseur- und Kosmetikausbildung für junge Frauen in Mbarara. Abschlussbericht mit Sach- und Finanzbericht

15. Dezember 2024 bis 14. Juni 2025



Teilnehmerinnen mit ihren Zertifikaten vor dem Ausbildungsgebäude in Mbarara.

18

junge Frauen mit Abschlusszertifikat

7 von 18

direkt von ihren Praktikumsbetrieben angestellt

24


geplante Projektwochen einschließlich Einrichtung, Praxis und Prüfungen

MSINGI SCHOOL OF BTVET · P 24/200 · 2024/2025

Auf einen Blick

In Mbarara fehlen vielen jungen Frauen berufliche Perspektiven. Gemeinsam mit der Nyentsya Community Development Association (NCDA) hat Bantu e.V. an der Msingi School of BTVET eine sechsmonatige Ausbildung zur Friseurin und Kosmetikerin ermöglicht, ergänzt durch Gesundheitsbildung, Kurse in Unternehmensführung und Finanzen sowie Lese- und Schreibkurse. 18 junge Frauen haben die Ausbildung abgeschlossen; sieben wurden direkt von ihren Praktikumsbetrieben übernommen.

Von 25 geplanten Plätzen zum Abschluss



Jedes Kästchen steht für einen geplanten Ausbildungsplatz. Dunkelblau: Absolventin, direkt angestellt (7). Hellblau: Absolventin mit Zertifikat (11). Gestrichelt: geplanter Platz ohne Abschluss (7).

72 %

der geplanten 25 Plätze mit Abschluss (18)

39 %

sofort angestellt (7 von 18, gerundet)

11.220,74 €

Einnahmen (Ist); die endgültigen Ausgaben sind in Abstimmung

Alle 18 Teilnehmerinnen bestanden die theoretische und die praktische Abschlussprüfung. Der Zielwert von mindestens zehn Absolventinnen in Beschäftigung oder Selbstständigkeit ist mit sieben Anstellungen bis zum Sachbericht (März 2026) noch nicht erreicht; zu Gründungen liegen keine Angaben vor.

Quellen: Sachbericht, finanzieller Verwendungsnachweis sowie Finanzierungsplan und Belegliste (Teil C) zu P 24/200. Die Quelldokumente tragen unterschiedliche Datumsangaben (1. März, 20. März und 8. Mai 2026); welche Fassung eingereicht und anerkannt wurde, wird geprüft. Berichtszeitraum: 15.12.2024 bis 14.06.2025.

Korrekturhinweis · 12. November 2026

Diese korrigierte Ausgabe ersetzt die Ausgabe vom 10. November 2026. Geändert wurde:

- Die endgültigen Ausgaben sind in Abstimmung: Finanzierungsplan (11.209,95 €), Belegliste (rund 0,15 € Abweichung) und Jahresbericht 2025 (11.190,70 €) weichen voneinander ab. Der Restbetrag wird erst nach Freigabe angegeben; die frühere Erklärung als reine Rundungsdifferenz wurde entfernt.
- Die Personalsumme wird mit den Gehaltsbelegen abgeglichen (Zuordnung der Kosten der Lese- und Schreibkurse offen). Personalkosten bleiben gebündelt ausgewiesen.
- „24 Wochen Ausbildung“ lautet jetzt „24 geplante Projektwochen“ einschließlich Einrichtung der Räume; Praktikumszeiten werden geprüft.
- Kontextzahlen ohne Quelle (45 %, 55 %) wurden entfernt; die HIV-Prävalenz von 14,4 % ist jetzt mit Quelle, Gebiet, Altersgruppe und Jahr belegt.
- Die Rolle der Schmitz-Stiftungen ist als Mitträger des EZ-Kleinprojektefonds beschrieben.
- Datumsangaben: Berichtszeitraum und Stand der Quelldokumente sind getrennt; die eingereichte Fassung wird geprüft.

Als „in Abstimmung“ oder „in Prüfung“ gekennzeichnete Zahlen sind nicht bestätigt. Sie werden ersetzt, sobald Vorstand und Steuerberatung die abgestimmten Zahlen freigegeben haben.

Projektprofil

Projekttitel	Msingi School of Business, Technical, Vocational Education and Training: Friseur- und Kosmetikkurse
Projektnummer	P 24/200
Laufzeit	15. Dezember 2024 bis 14. Juni 2025 (sechs Monate, wie bewilligt)
Ort	Gemietete Räume in Mbarara City (Biafra Cell), Uganda: Klassenraum, Ausbildungssalon und Büro
Deutscher Träger	Bantu-Vereinigung für globale Bildung, Gerechtigkeit und Zusammenarbeit e.V., Berlin
Partnerorganisation	Nyentsya Community Development Association (NCDA), Mbarara, mit dem Lehrteam der Msingi School of BTVET
Förderung	Stiftung Nord-Süd-Brücken (EZ-Kleinprojektefonds, mit Mitteln des BMZ) und Eigenmittel von Bantu e.V. Der EZ-Kleinprojektefonds wird von der Stiftung Nord-Süd-Brücken gemeinsam mit den Schmitz-Stiftungen getragen; ein eigener Betrag der Schmitz-Stiftungen ist in der Projektabrechnung nicht ausgewiesen.
Zielgruppe	Arbeitslose junge Frauen von 18 bis 35 Jahren aus Mbarara und Umgebung

Ausgangslage

Die Jugendarbeitslosigkeit in Mbarara ist hoch, Angebote zur Berufsbildung sind rar. Viele junge Menschen verlassen mangels Alternativen die ländlichen Gebiete. Ihre berufliche Entwicklung ist deshalb von zentraler Bedeutung.

Viele der jungen Frauen, an die sich das Projekt richtete, hatten die Schule abgebrochen oder nur die Grundschule abgeschlossen. Sie verfügten weder über verwertbare berufliche Fähigkeiten noch über wirtschaftliche Perspektiven. Weil die HIV-Prävalenz im Distrikt Mbarara nach dem HIV/AIDS-Factsheet 2023 der Uganda AIDS Commission bei 14,4 % lag (Erwachsene von 15 bis 49 Jahren, Schätzung für 2022), gehörte Gesundheitsbildung von Anfang an zum Programm.

Auswahl der Teilnehmerinnen

Die Teilnehmerinnen wurden gemeinsam mit lokalen Gemeindeführern, Vertreterinnen und Vertretern christlicher und muslimischer Gemeinden sowie Vertrauenspersonen aus der Nachbarschaft ausgewählt. Dabei wurde bewusst auf sozioökonomische Benachteiligung geachtet; Frauen erhielten Vorrang.

Der Ablauf: 24 geplante Projektwochen

Der Ablaufplan umfasst 24 geplante Projektwochen. In den ersten beiden Wochen wurden die gemieteten Räume renoviert, gestrichen und mit Möbeln und Salonausstattung eingerichtet. Danach begann die eigentliche Ausbildung. Das sechswöchige Praktikum ist im Ablaufplan nicht gesondert ausgewiesen; die tatsächlichen Unterrichtswochen und Praktikumszeiten werden anhand der Anwesenheitslisten geprüft. Der Lehrplan lehnte sich an die nationalen BTVET-Standards Ugandas an und wurde in Zusammenarbeit mit dem Nyamitanga Vocational Training College regelmäßig überprüft.

Wochen	Inhalt
1 und 2	Renovierung und Einrichtung von Klassenraum, Salon und Büro
3 bis 5	Hygienestandards und Kundenberatung
6 bis 8	Fortgeschrittene Haarschnitttechniken, etwa Bobs und Texturierung
9 bis 12	Farbtheorie, chemische Haarbehandlung, Perückenvorbereitung und Haarglättung
13 und 14	Styling: Föhnen, Locken und Hochsteckfrisuren
15 und 16	Arbeit mit verschiedenen Haartypen und Extensions
17 und 18	Nagelpflege und Nail Art
19 und 20	Kundenservice und Beratungskompetenz
21 bis 24	Praxis mit Modellen, Prüfungen, Präsentation der Portfolios bei der Zertifizierungsfeier



Unterricht im Ausbildungssalon.



Theorie am Flipchart.

Begleitende Angebote


- **Gesundheitsbildung:** ein Workshop zu HIV/Aids-Prävention und reproduktiver Gesundheit, der alle 18 Teilnehmerinnen erreichte.
- **Unternehmensführung und Finanzen:** zwei praxisorientierte Workshops zu Betriebsführung, Buchführung und Finanzplanung, als Rüstzeug für eine mögliche Selbstständigkeit.
- **Lesen und Schreiben:** Kurse parallel zur Ausbildung, vor allem für Teilnehmerinnen mit geringer Schulbildung, damit sie Rechnungen schreiben, Termine koordinieren und mit Kundinnen professionell kommunizieren können.
- **Praktikum:** sechs Wochen in Friseursalons in Mbarara.



Flechten: praktische Übung an langen Zöpfen.



Der Ausbilder zeigt einen Arbeitsschritt am Modell.

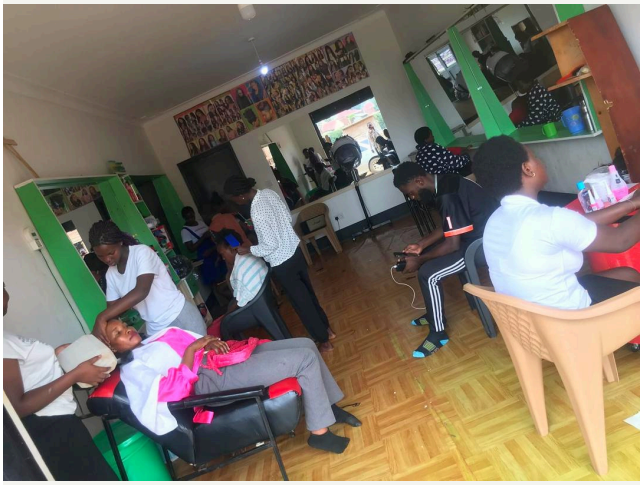

Haarwäsche als praktische Übung.



Der Ausbildungssalon bei der Arbeit.

Ergebnisse: Ziele und Erreichtes

Das Projekt sollte die Beschäftigungsfähigkeit junger Frauen in Mbarara durch eine umfassende Ausbildung im Friseurhandwerk und in der Kosmetik verbessern und damit einen Beitrag zur Armutsreduzierung leisten (SDG 1). Die Gegenüberstellung zeigt die Zielwerte aus dem Antrag und den Stand bei Projektabschluss.

Ziel	Ausgangslage	Zielwert laut Antrag	Stand bei Abschluss
Projektziel: 25 junge Frauen erhalten eine umfassende Berufsausbildung	Die Zielgruppe hatte keine beruflichen Fähigkeiten erworben und war arbeitslos.	25 junge Frauen in sechs Monaten ausgebildet; mindestens 10 in Beschäftigung oder mit eigenem Betrieb	18 junge Frauen ausgebildet (72 %); 7 Absolventinnen in Friseursalons angestellt
Unterziel 1: Zugang zu Friseur- und Kosmetikkursen	Benachteiligte junge Frauen haben kaum Zugang zu Berufsausbildung.	25 junge Frauen zur Friseurin und Kosmetikerin ausgebildet	18 Abschlüsse mit Zertifikat; alle zeigten arbeitsmarktreife Fähigkeiten
Unterziel 2: Karriere-Coaching und Unterstützung	Keine Berufsberatung und keine Unterstützung bei einer Gründung	Alle Auszubildenden nutzen Coaching; mindestens 10 leben von Anstellung oder eigenem Betrieb	Alle 18 erhielten Business- und Finanzwissen in zwei Workshops; 7 angestellt (39 %)

Soll und Ist

Ausbildung mit Zertifikat abgeschlossen **18 / 25**



In Beschäftigung (Ziel: mindestens 10, einschließlich Gründungen) **7 / 10**



Stand: Sachbericht zum Projektabschluss (März 2026). Die sieben Anstellungen entstanden direkt aus dem Praktikum.

Warum 18 statt 25?

Die geringere Zahl lag vor allem an persönlichen Umständen einzelner Bewerberinnen: Einige konnten die tägliche Anreise nicht bewältigen, andere mussten aus familiären Gründen ausscheiden. Für Teilnehmerinnen aus entlegenen Gebieten stellte die Msingi School einen Unterkunftsraum in Schulnähe bereit.



Abschlussfeier: Übergabe eines Zertifikats.



Gruppenfoto bei der Abschlussfeier.



Frisieren unter dem Festzelt bei einer Veranstaltung im Freien.

Weitere Wirkungen

Neben den geplanten Ergebnissen traten unerwartete positive Effekte ein:

- **Engagement in der Nachbarschaft:** Bewohnerinnen und Bewohner der Biafra Cell erkundigten sich regelmäßig nach dem Fortschritt und brachten ihre Unterstützung zum Ausdruck.
- **Solidarität untereinander:** Die Teilnehmerinnen bildeten aus eigener Initiative informelle Selbsthilfegruppen, in denen sie sich bei persönlichen und beruflichen Herausforderungen

unterstützen.

- **Lesen und Schreiben:** Die zusätzlichen Kurse stärkten gerade die Teilnehmerinnen mit geringer Schulbildung im Umgang mit Rechnungen, Terminen und Kundinnen.

Über die Teilnehmerinnen hinaus profitierten ihre Familien von zusätzlichem Haushaltseinkommen, und Friseursalons in Mbarara können auf besser ausgebildete Fachkräfte zurückgreifen.

Zusammenarbeit vor Ort

Die Msingi School kooperierte eng mit Friseursalons in Mbarara, die als Praktikumsstellen dienten. Das war ein zentraler Erfolgsfaktor: Die Auszubildenden sammelten Erfahrung im echten Arbeitsumfeld und konnten sich bei möglichen Arbeitgebern beweisen. Mit dem Local Council 1 der Biafra Cell stellte die Schule die Einrichtung offiziell vor und stellte die Einhaltung der lokalen Vorschriften sicher; das Nyamitanga Vocational Training College begleitete die Qualitätssicherung des Lehrplans.

Risiken und Lösungen

Risiko	Maßnahme
Erreichbarkeit	Teilnehmerinnen aus entlegenen Gebieten konnten die Schule nur schwer täglich erreichen. Die Msingi School stellte einen Unterkunftsraum in Schulnähe bereit.
Personalengpässe	Zwei Vollzeit-Lehrkräfte teilten sich Ausbildung und Verwaltung, um die Projektleitung zu entlasten.
Qualität	Der Lehrplan orientierte sich an den nationalen BTVET-Standards und wurde mit dem Nyamitanga Vocational Training College regelmäßig überprüft.
Wechselkurs	Der ungünstigere Kurs (3.720,56 statt 4.000 UGX je Euro) wurde durch Einsparungen bei einzelnen Posten und höhere Eigenmittel von Bantu e.V. aufgefangen.
Rechtliche Vorgaben	Das Personal wurde auf Honorarbasis engagiert, wie es den ugandischen Rahmenbedingungen für Gemeindeorganisationen ohne Steuer-Identifikationsnummer entspricht.

Finanzen

Das Projekt wurde nach den Richtlinien des EZ-Kleinprojektefonds der Stiftung Nord-Süd-Brücken abgerechnet. Die Gesamteinnahmen betrugen 11.220,74 €. **Die endgültigen Gesamtausgaben sind in Abstimmung (Stand 12.11.2026):** Der Finanzierungsplan weist 11.209,95 € aus; die Belegliste ergibt bei einheitlicher Umrechnung einen um rund 0,15 € abweichenden Betrag, und der Jahresbericht 2025 nannte 11.190,70 €. Auch die Personalsumme wird mit den Gehaltsbelegen abgeglichen; die Zuordnung der Kosten für die Lese- und Schreibkurse ist noch offen. Die folgenden Ist-Werte entsprechen dem Finanzierungsplan und sind nicht bestätigt. Der Restbetrag ergibt sich als Einnahmen abzüglich Ausgaben; er steht erst nach der Abstimmung fest und wird nach den Richtlinien des Fonds behandelt.

Einnahmen


Quelle	Plan	Ist	Anteil Ist
Stiftung Nord-Süd-Brücken (EZ-Kleinprojektefonds), drei Raten	8.380,00 €	8.380,00 €	74,7 %
Eigenmittel Bantu e.V., zwei Tranchen	700,13 €	2.840,74 €	25,3 %
Finanzieller Beitrag der Partnerorganisation	2.093,87 €	0,00 €	0,0 %
Gesamteinnahmen	**11.174,00 €**	**11.220,74 €**	**100 %**

Der geplante Beitrag der Nyentsya CDA konnte nicht erbracht werden: Als kleine Gemeindeorganisation verfügte sie nicht über die nötigen finanziellen Mittel. Bantu e.V. glich diese Lücke und die Wechselkursverluste aus und stellte statt 700,13 € insgesamt 2.840,74 € Eigenmittel bereit, 2.140,61 € mehr als geplant. Die Durchführung des Projekts war dadurch zu keinem Zeitpunkt gefährdet.

Ausgaben

Kostenposition	Plan	Ist	Abweichung
1.1 Ausstattung Salon (Friseur und Kosmetik)	3.325,00 €	3.558,34 €	+7,0 %
1.2 Büro und Verwaltung	1.331,50 €	1.980,93 €	+48,8 %
2.1 Betriebsausgaben (Miete)	1.445,00 €	1.075,13 €	–25,6 %
3.1 Personal (gesamt)	3.990,00 €	4.495,55 €	+12,7 %
3.2 Personal: Lohnsteuer und Sozialabgaben	349,50 €	0,00 €	–100 %
5. Mittelreserve	313,00 €	0,00 €	–100 %
6. Verwaltungskosten	420,00 €	100,00 €	–76,2 %
Gesamt	**11.174,00 €**	**11.209,95 €**	**+0,3 %**

Wofür das Geld ausgegeben wurde

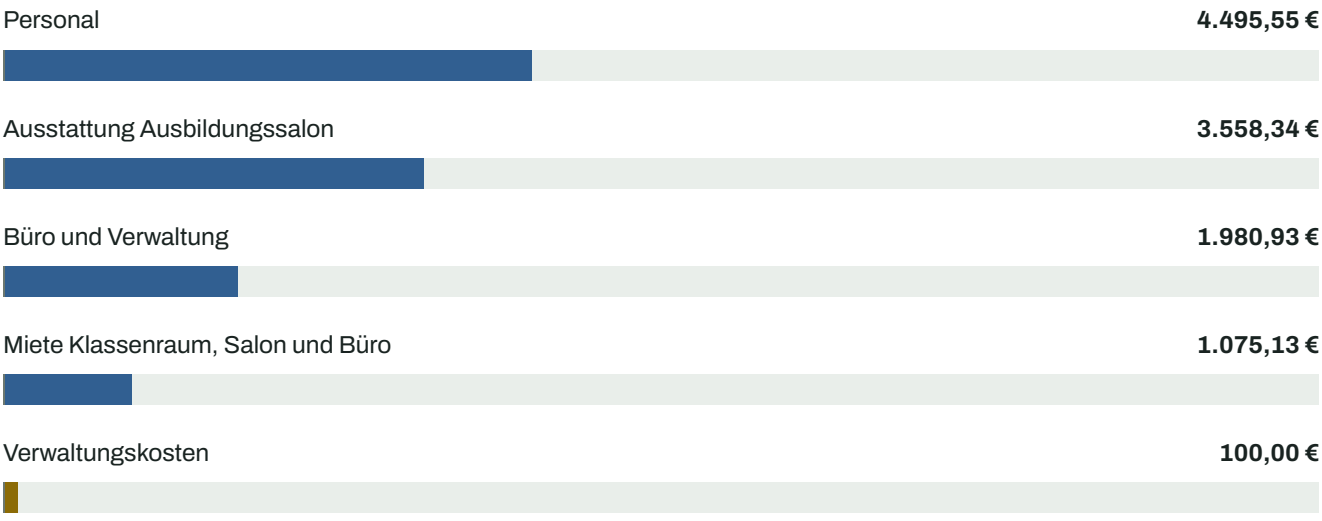

Erläuterungen zu den Abweichungen

- **Ausstattung Salon:** 31 Positionen von Föhnen und Friseursesseln über Waschbecken, Sterilisatoren und Übungsköpfe bis zur Lehrtafel. In Uganda gibt es keine staatlich festgelegten Verbraucherpreise; die Marktpreise schwankten zwischen Planung und Kauf. Zudem setzte die Steuerbehörde ihr

elektronisches Rechnungssystem (EFRIS) verstärkt durch, sodass auch auf kleineren Rechnungen Mehrwertsteuer ausgewiesen werden musste.

- **Büro und Verwaltung:** Telefon und Internet wurden zusammen abgerechnet. Für den Klassenraum wurden neben Tischen und Bänken zusätzlich zwei Computerarbeitsplätze mit Trennwänden benötigt. Dafür entfielen ein Wasserspender und die Trinkwasserlieferung als eigene Positionen.
- **Betriebsausgaben:** Die Miete wurde in zwei Raten gezahlt. Internetkosten und Druckerpatronen wurden unter Büro und Verwaltung abgerechnet.
- **Personal:** Die Personalausgaben sind hier als Gesamtsumme ausgewiesen; sie werden derzeit mit den Gehaltsbelegen abgeglichen. Die Vergütung entsprach dem lokalen Gehaltsniveau in Mbarara. Die Verträge waren mit 4.000 UGX je Euro kalkuliert; beim tatsächlichen Kurs kostete dieselbe Vergütung mehr Euro. Lohnsteuer und Sozialabgaben fielen nicht an, weil alle Gehälter unter dem ugandischen Steuerfreibetrag lagen. Gemessen am gesamten Planansatz für Personal (4.339,50 €) liegen die Ausgaben um 3,6 % höher.
- **Verwaltungskosten:** Abgerechnet wurden 100,00 € für Koordination und Berichterstattung. Weitere Verwaltungsaufwände, darunter die Gebühren für die Geldtransfers, trug Bantu e.V. aus allgemeinen Mitteln.

Wechselkurs und Geldtransfer

Geplanter Kurs (Antrag)	1 EUR = 4.000 UGX
Tatsächlicher gewichteter Kurs	1 EUR = 3.720,56 UGX (–6,99 %)
Überweisungen	19 Transfers vom 28. Dezember 2024 bis 12. Juni 2025
Überwiesen und empfangen	11.220,74 € · 41.747.482 UGX

Die Partnerorganisation hatte zu Projektbeginn noch kein eigenes Bankkonto. Die Mittel wurden deshalb über den regulierten Transferdienst Remitly per Mobile Money überwiesen, die innerhalb weniger Stunden ankamen. Während der Laufzeit beschaffte die Nyentsya CDA ihre Registrierung als Gemeindeorganisation und eine Gewerbelizenz und eröffnete ein Bankkonto. Künftige Projektmittel überweist Bantu e.V. ausschließlich per Banküberweisung auf dieses Konto.

Nachhaltigkeit und Ausblick

Das Ausbildungszentrum soll sich nach Projektende durch erschwingliche Friseur- und Kosmetikdienstleistungen für die Nachbarschaft selbst tragen. Die angeschaffte Ausstattung, von Friseurspiegeln und Trockenhauben bis zu Waschbecken und Scheren, bleibt vor Ort und dient dem Salonbetrieb ebenso wie künftigen Ausbildungsjahrgängen.

Die 18 Absolventinnen verfügen über Fähigkeiten, mit denen sie ihren Lebensunterhalt verdienen können: Sieben arbeiten bereits in Salons, die übrigen haben das Rüstzeug für einen eigenen kleinen Betrieb erhalten. Dass Praktikumsbetriebe Absolventinnen übernahmen, war nicht geplant und zeigt, wie groß die Nachfrage nach gut ausgebildeten Fachkräften in Mbarara ist. Die Zusammenarbeit zwischen Bantu e.V. und der Nyentsya CDA hat sich als tragfähig erwiesen und ist eine gute Grundlage für Folgeprojekte.

> „Eure Zertifikate sind nicht nur ein Stück Papier. Sie sind der Beweis, dass ihr die Fähigkeiten, den Mut und die Entschlossenheit habt, euren Weg zu gehen. Ich bin stolz auf euch."
>
> Boaz Murinzi Murema, Vorsitzender von Bantu e.V., an die 18 Absolventinnen (Jahresbericht 2025)

Öffentlichkeitsarbeit

Bantu e.V. berichtet über das Projekt digital, auf www.bantu-ev.org und in den sozialen Medien, und verzichtet bewusst auf gedruckte Materialien. Die Förderung durch die Stiftung Nord-Süd-Brücken wird in allen Veröffentlichungen genannt.

Dank

Wir danken der Stiftung Nord-Süd-Brücken für die Förderung aus dem EZ-Kleinprojektefonds, der Nyentsya Community Development Association in Mbarara und vor allem dem gesamten Lehrteam der Msingi School of BTVET für die hervorragende Umsetzung vor Ort, den Friseursalons in Mbarara für die Praktikumsplätze und den 18 Absolventinnen für ihren Mut und ihre Ausdauer.

stiftung nord-süd brücken

Im Auftrag des Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Grundlage dieses Berichts: Sachbericht, finanzieller Verwendungsnachweis, Finanzierungsplan und Belegliste (Teil C) zu P 24/200; die Dokumente tragen unterschiedliche Datumsangaben, die eingereichte und anerkannte Fassung wird geprüft. Kontextangabe zur HIV-Prävalenz: Uganda AIDS Commission, HIV/AIDS Factsheet 2023. Öffentliche Fassung: Namen von Beschäftigten, Einzelgehälter, Kontodaten und Belegnummern sind nicht enthalten. Alle abgebildeten Personen haben der Veröffentlichung zugestimmt. Quellen der Erläuterungen laut Verwendungsnachweis: Bank of Uganda, Uganda Revenue Authority, GSMA, Richtlinien des EZ-Kleinprojektefonds.

Bantu e.V.

Gemeinsam bauen wir nachhaltige und selbstbestimmte Gemeinschaften.

KONTAKT

Bantu e.V.
Kameruner Str. 1
13351 Berlin
Postfach 120344, 10593 Berlin

info@bantu-ev.org
www.bantu-ev.org
+49 176 34213765

UNSERE ARBEIT UNTERSTÜTZEN

www.bantu-ev.org

GLS Gemeinschaftsbank eG
IBAN DE47 4306 0967 1035 6810 00
BIC GENODEM1GLS

Amtsgericht Charlottenburg
VR 37606 B

> Dieser Abschlussbericht fasst Sachbericht, finanziellen Verwendungsnachweis und Finanzierungsplan des Projekts zusammen. Korrigierte Fassung vom 12. November 2026; offene Punkte sind im Korrekturhinweis am Anfang des Berichts genannt.

Ausgabe für die Website · November 2026 · korrigiert am 12. November 2026

Bantu-Vereinigung für globale Bildung, Gerechtigkeit und Zusammenarbeit e.V.

Finanzamt für Körperschaften I Berlin · Steuernummer 27/661/53393
